

Nyhedsbrev 2: Område 2 i Slagelse Vest

10. juli 2024

Kontaktperson:
Hans Post
T: 58 36 25 00
E: fjvslagelsevest@envafors.dk

Udbygning af fjernvarmenettet i Slagelse Vest

Entreprenøren er i fuld gang med at få etableret stikledninger på Thorvaldsensvej samt Thorvaldsens Have og inden længe begynder de på Trekanten 32-56. På Thorvaldsensvej vil entreprenøren starte med etablering af de nye hovedledninger i løbet af uge 28.

Efter entreprenøren har afholdt deres sommerferie, starter de i løbet uge 35 med gravearbejdet for de nye hovedledninger på Thorvaldsens Have.

I uge 32 bliver der leveret fjernvarmerør til Trekanten og Gyldenløvesgade. Rørene bliver lagt i 1-2 rørbunker i jeres område. Efterfølgende bliver fjernvarmerørene sammensvejest og får monteret muffer, så rørene er klar til at blive lagt i jorden.

På strækninger, hvor der arbejdes med fjernvarmen, vil kørebaner som udgang være lukket for trafik i perioden fra ca. kl. 7:00 til og med kl. 15:00 og vi håber på jeres forståelse herfor 😊. Man vil kunne høre maskinerne og det vil støve mens vi arbejder og det vil ryste når jorden komprimeres. Vi håber ligeledes på jeres forståelse herfor.

LK Group er nu færdige med at lave stikaftaler for område 2 😊. Skulle der være nogen som har indgået fjernvarmekontrakt og endnu ikke har haft besøg må meget gerne sende en mail, så vi kan fastlagt fjernvarmestikket hos jer.

Når entreprenøren er færdig med udførelsen af jeres fjernvarmestik, vil der blive udleveret en tilfredshedserklæring fra entreprenøren, hvor I kan komme med ris eller ros i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Det er også på tilfredshedserklæringen I bedes oplyse evt. fejl og mangler, så disse kan blive udbedret af entreprenøren. Tilfredshedserklæringen vil enten blive udleveret af entreprenøren selv eller den vil blive lagt i jeres postkasse.

Entreprenøren MSE holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31, og derfor vil der være mindre bemanding og aktivitet i jeres område i den nævnte ferieperiode.

Vejledende tidsplan for område 2:

Trekanten: Hovedledninger forventes udført fra uge 30 til og med uge 36. Stik forventes udført fra uge 30 til og med uge 34.

Thorvaldsensvej: Hovedledninger forventes udført fra uge 28 til og med uge 30. Stik er næsten færdig.

Thorvaldsens Have: Hovedledninger forventes udført fra uge 35 til og med uge 37. Stik forventes udført fra uge 26 til og med uge 27.

Gyldenløvesgade: Hovedledninger forventes udført fra uge 31 til og med uge 33. Stik er i gang.

Kalundborgvej etape 2: Hovedledninger forventes udført fra uge 35 til og med uge 37. Stik forventes udført fra uge 35 til og med uge 37.

Kalundborgvej etape 3: Hovedledninger forventes udført fra uge 38 til og med uge 40. Stik forventes udført fra uge 38 til og med uge 40.

Holmstrupvej 56A-56M: Hovedledninger forventes udført fra uge 34 til og med uge 35. Stik forventes udført fra uge 33 til og med uge 47.


Vejledende udførelstider for stikledninger vil blive tilføjet tidsplanen i nyhedsbrevene løbende for vejene i jeres område.

Nyttige mail-adresser

Envafors:	E-mail
Hans Post – Projektleder og tilsyn	fjvslagelsevest@envafors.dk
Hovedentreprenør MSE A/S:	
Brian Pyndt – Formand	bp@mse-as.dk
Kaj Hansen – Formand f. stik	kfh@mse-as.dk
Louise Jørgensen – Projektassistent v. spørgsmål til før-fotoregistrering mv.	lkj@mse-as.dk

Med venlig hilsen
Hans Post

Oversigtstegning med etapeinddeling for område 2:

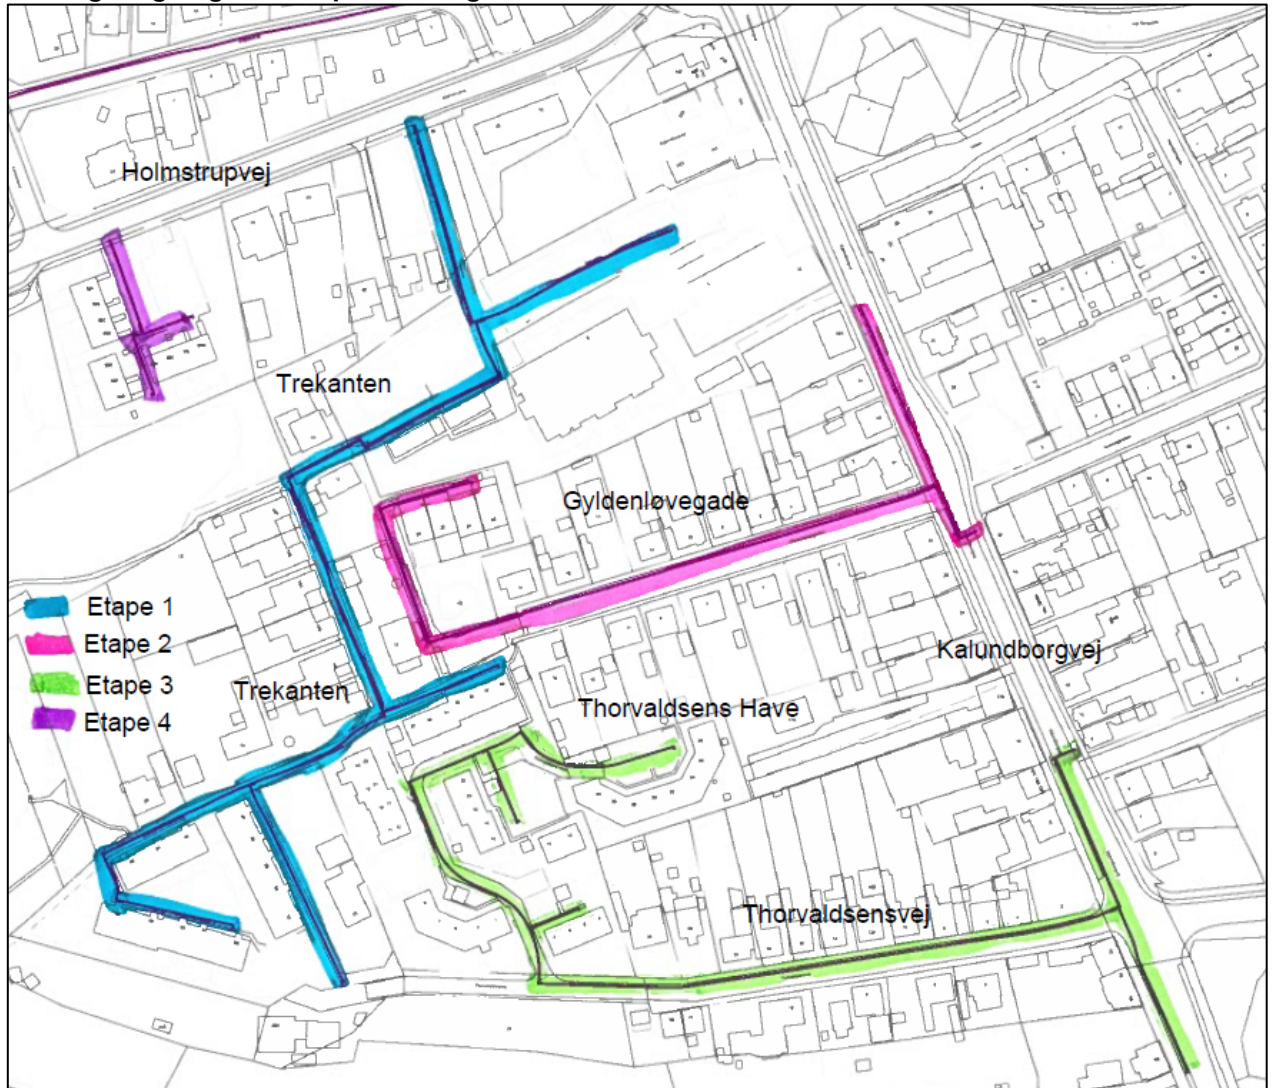

Slagelse Vest - Område 2.
