

Nyhedsbrev juni

Juni 2024

Envafors
Nordvej 7
4200 Slagelse
fjvhalsskov@skforsyning.dk

Til beboere som skal have fjernvarme i Halsskov

Område 3.1

Det gælder os, at vi nu har vand på rørene i område 3.1. Vi har etableret hovedledning på Halsskovvej syd, stik er ved at være afsluttet. Der udestår 6 stik på Revvej, som tages, når trafikafvikling tillader det. Der mangler belægning i midten af rundkørsel Revvej, Skolegade, Suhrsvej. Asfaltering pågår i hele området.

Område 3.2

Birkemosevej er afsluttet og skal slutasfalteres. Der er udestående asfalt på Mosevangen, vi arbejder på en løsning, hvor kanten, vi har arbejdet mod, lægges om i fuld længde. Halsskovvej nord er i fuld gang. Nyvej er ved at være afsluttet, herefter er der Vulcanvej. Der lægges sidste hånd på retablering i hele området. Det forventes, at der kommer fjernvarme i området 30/6.

Område 3.3

Vi er startet med etablering af hovedledning på Lærkevej, arbejdet med stik er påbegyndt. Hovedledning på Hyvingevej er startet.

Område 3.4

Arbejdet med at konvertere fra gas til fjernvarme er godt i gang, der fuld gang i retablering af græs.


Område 4

Efter flere udsættelse glæder det, at vi sætter vand på Tårnborgevej den 30. juni. Arbejdet med at etablere stik Tårnborgevej syd er ved at være afsluttet, herefter skal de sidste 20 stik Tårnborgevej nord udføres. Vi er ved at lægge slidlag på første etape på Tårnborgevej. Der asfalteres i takt med fremdrift for stikarbejder.

Område 5

Energivej-Grønlandsvej-Storebælts erhvervspark

Alt arbejde vedrørende etablering af fjernvarme er afsluttet, og der er fjernvarme i rørene, der udestår enkelte retableringer.

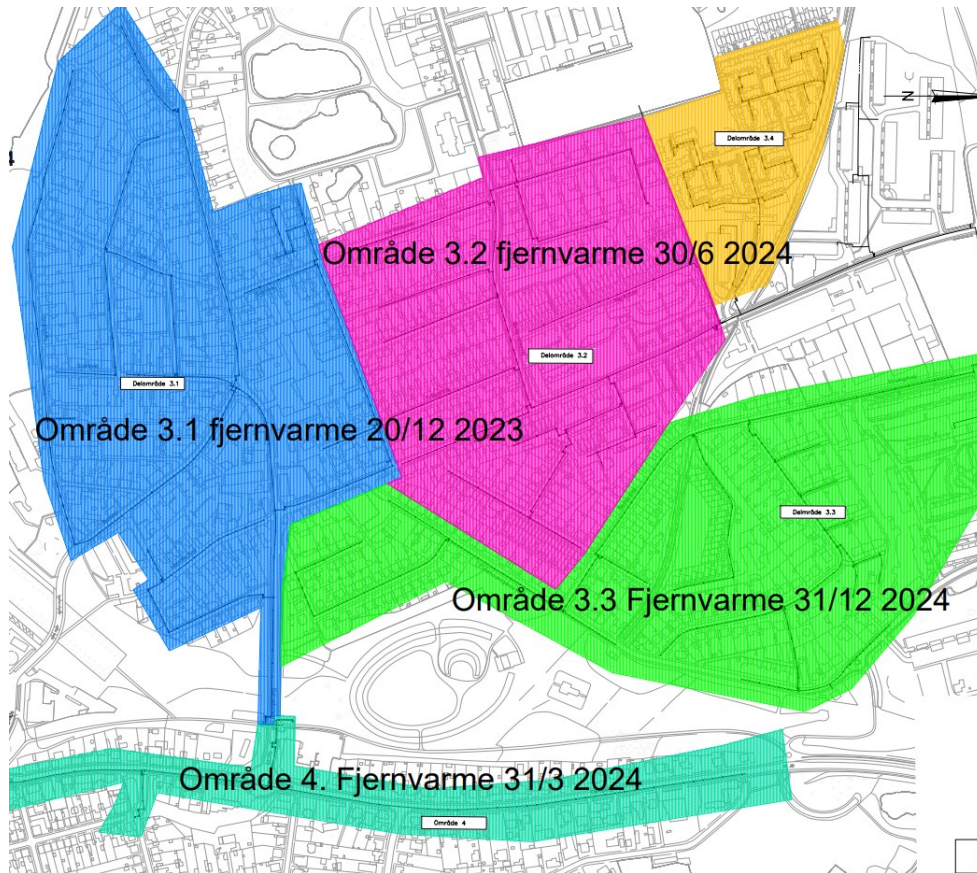

Område 4 - Fjernvarme 30. juni 2024

Etablering af ny asfaltbelægning

Vi asfalterer så hurtigt som muligt. Asfalt lægges som gab (grov asfalt, som fræses af efter et år, og der etableres slidlag).

Undskyld, vi forstyrrer!

Vi kan desværre ikke undgå, at det støjer, ryster og støver lidt, når entreprenøren arbejder. Det støjer, når der anvendes gravemaskiner, samt når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne, og det ryster, når jorden komprimeres. Der må i anlægsperioden forventes en del gener fra entreprenørens maskiner, opgravede kørebaner, mm., men vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne.

Trafikale forhold

I forbindelse med fjernvarmearbejdet vil de trafikale adgangsforhold blive påvirket af anlægsarbejdet. Kørebanen vil være indsnævret på strækningen, hvor der arbejdes, og enkelte steder kan det blive nødvendigt at omdirigere eller spærre for trafikken i perioder. På strækninger, hvor der arbejdes, vil der i berørte indkørsler blive udlagt køreplader.

Hvis man ikke skal have fjernvarme og vil modtage nyhedsbrev, kan man tilmelde sig på nedenstående mail.

Her besvares eventuelle spørgsmål: fjvhalsskov@skforsyning.dk

Venlig hilsen

Jesper Lodall

Projektleder i Envafors
